




# STATO D'AVANZAMENTO LAVORI PER AREA

01/02/10

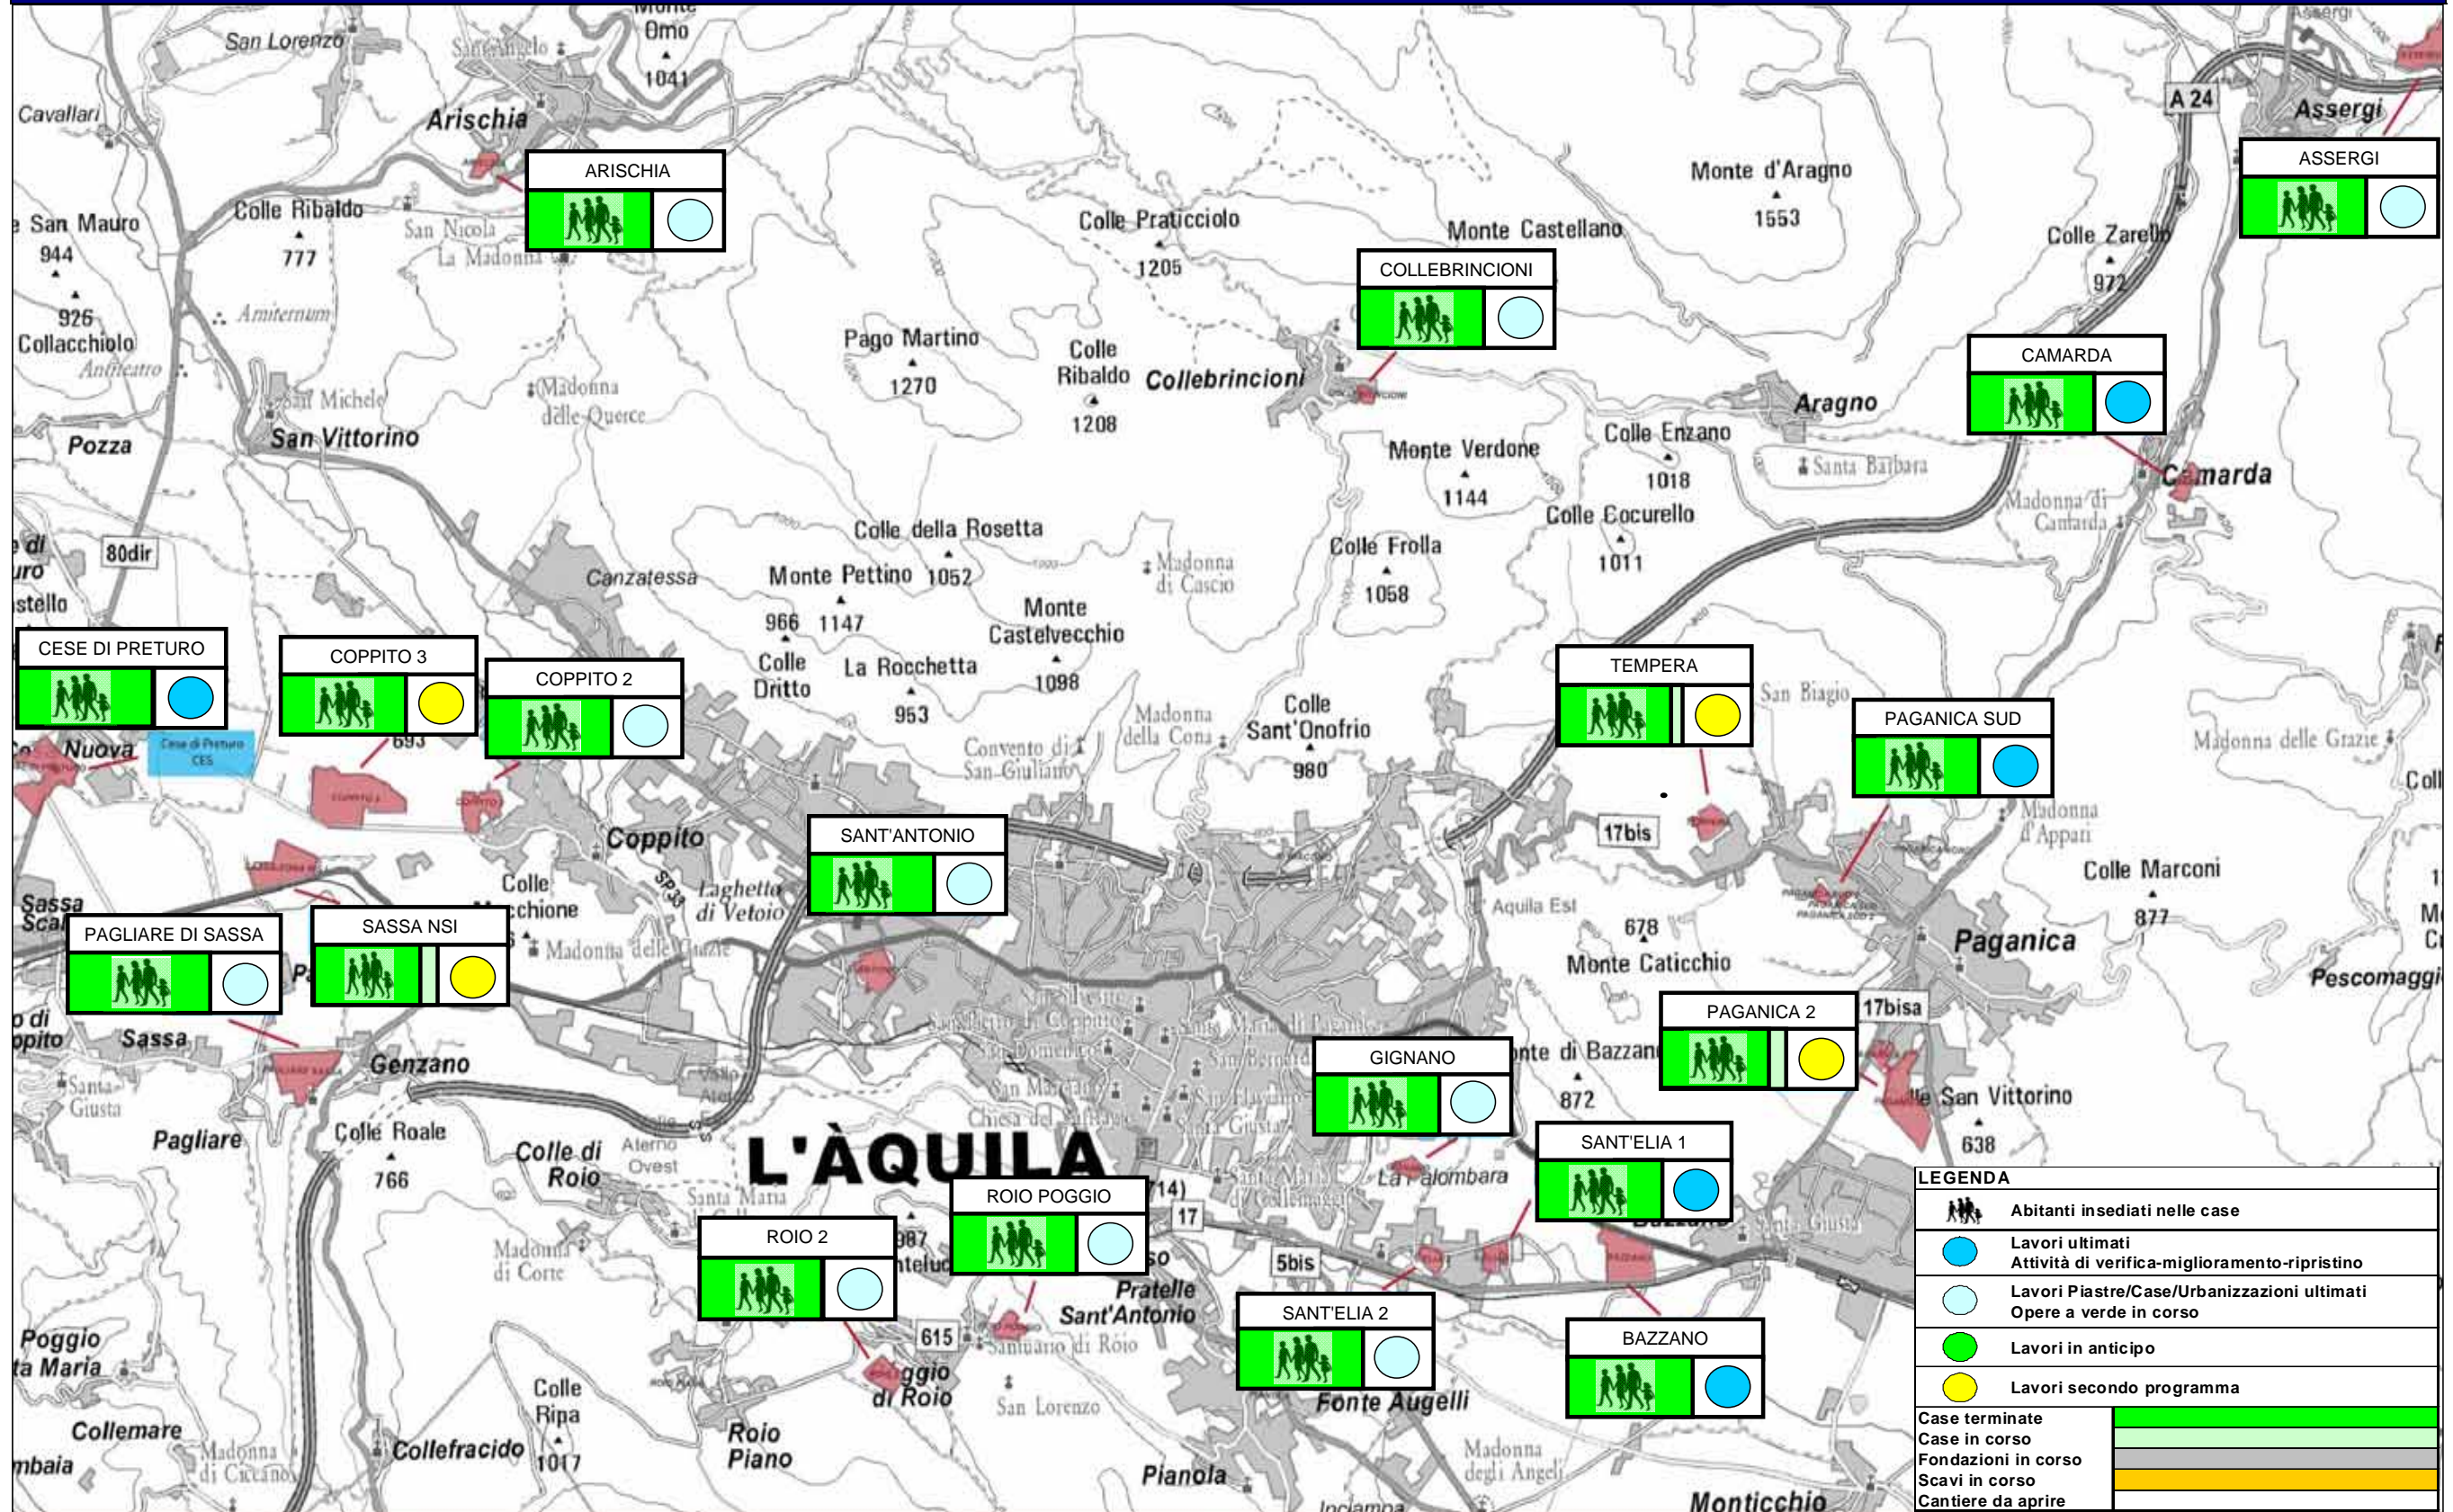

LEGENDA	
	Abitanti insediati nelle case
	Lavori ultimati
	Attività di verifica-miglioramento-ripristino
	Lavori Piastre/Case/Urbanizzazioni ultimati
	Opere a verde in corso
	Lavori in anticipo
	Lavori secondo programma
	Case terminate
	Case in corso
	Fondazioni in corso
	Scavi in corso
	Cantiere da aprire



## OBIETTIVI DELLA SETTIMANA IN CORSO E DELLA SETTIMANA PROSSIMA 01/02/10

Attività settimana precedente	Attività settimana in corso	Attività prossima settimana
25/01/2010 - 31/01/2010	01/02/2010 - 07/02/2010	08/02/2010 - 14/02/2010
<p>- Il giorno 29/01/2010 sono stati consegnati alla popolazione ulteriori due edifici a Paganica 2, un edificio a Coppito 3 e gli ultimi tre edifici di Coppito 2. Il numero di edifici del progetto C.A.S.E. consegnati è salito a 169, pari al 92% del totale.</p> <p>- Sono proseguiti i lavori di urbanizzazione, in particolare nelle aree di Paganica 2, Coppito 2 e Coppito 3, la realizzazione degli edifici ancora da ultimare e le opere a verde.</p>	<p>- Le consegne degli edifici del progetto C.A.S.E. alla popolazione nella settimana corrente sono programmate i giorni 2 e 5 febbraio, nelle aree di Paganica 2 e Coppito 3, per un totale di 5 edifici.</p> <p>- Sono in fase di ultimazione le urbanizzazioni a Paganica 2, Coppito 2 e Coppito 3 e la realizzazione degli edifici non ancora abitati.</p> <p>- In corso l'arredo delle abitazioni in consegna la settimana corrente e la prossima.</p> <p>- Le opere a verde proseguono compatibilmente con le condizioni meteorologiche.</p>	<p>- Nei giorni 09/02/2010 e 12/02/2010 sono in programma ulteriori consegne di edifici del progetto C.A.S.E. nell'area di Paganica 2.</p> <p>- Continueranno i lavori necessari alle ultime consegne, che si concluderanno entro febbraio 2010. Proseguiranno inoltre le attività di verifica, miglioramento e ripristino nelle aree i cui edifici sono stati tutti consegnati agli abitanti.</p>

AVANZAMENTO GENERALE PROGETTO			
Piastre iniziate	183	su 183 edifici	100%
Scavi terminati	183		100%
Piastre terminate (fondazioni)	183		100%
Piastre consegnate per la costruzione degli edifici	183		100%
Edifici antisismici iniziati	183		100%
Edifici antisismici ultimati	179		98%
Edifici antisismici arredati	177		97%
Edifici antisismici consegnati agli abitanti	169		92%

**N.B.:** Il numero complessivo di edifici del progetto C.A.S.E. dopo la Conferenza dei Servizi del 15/09/2009 e gli ultimi riscontri di cantiere è stato portato a 183 rispetto alla previsione iniziale di 150.



# STATO AVANZAMENTO / AREA: DETTAGLIO

01/02/10

Nome	PIASTRE										EDIFICI								
	Previste	Completate	LAVORAZIONI IN CORSO								Iniziati	LAVORAZIONI IN CORSO							
			Scavi		Platee		Pilastrì		Solai			Strutture		Impianti		Serramenti		Finiture	
In Corso	Completati	In Corso	Completate	In Corso	Completati	In Corso	Completati	In Corso	Completati	In Corso	Completate	In Corso	Completati	In Corso	Completati	In Corso	Completate		
SANT'ANTONIO	11	11	0	11	0	11	0	11	0	11	11	0	11	0	11	0	11	0	11
COLLEBRINCIONI	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3
CESE DI PRETURO	20	20	0	20	0	20	0	20	0	20	20	0	20	0	20	0	20	0	20
PAGLIARE DI SASSA	11	11	0	11	0	11	0	11	0	11	11	0	11	0	11	0	11	0	11
PAGANICA SUD 1	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3
PAGANICA SUD 2	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
TEMPERA	9	9	0	9	0	9	0	9	0	9	9	0	9	1	8	1	8	1	8
BAZZANO	21	21	0	21	0	21	0	21	0	21	21	0	21	0	21	0	21	0	21
SANT'ELIA 1	7	7	0	7	0	7	0	7	0	7	7	0	7	0	7	0	7	0	7
SANT'ELIA 2	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4
SASSA ZONA NSI	18	18	0	18	0	18	0	18	0	18	18	0	18	0	18	0	18	0	18
CAMARDA	5	5	0	5	0	5	0	5	0	5	5	0	5	0	5	0	5	0	5
ARISCHIA	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4
ROIO POGGIO	6	6	0	6	0	6	0	6	0	6	6	0	6	0	6	0	6	0	6
ROIO 2	6	6	0	6	0	6	0	6	0	6	6	0	6	0	6	0	6	0	6
ASSERGI 2	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4
PAGANICA 2	25	25	0	25	0	25	0	25	0	25	25	0	25	2	23	0	25	4	21
GIGNANO	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4
COPPITO 2	5	5	0	5	0	5	0	5	0	5	5	0	5	0	5	0	5	0	5
COPPITO 3	18	18	0	18	0	18	0	18	0	18	18	0	18	0	18	0	18	0	18

AREE DI PROGETTO

PIASTRE PREVISTE 183

EDIFICI ANTISISMICI PREVISTI 183

PIASTRE INIZIATE 183

EDIFICI ANTISISMICI INIZIATI 183

PIASTRE COMPLETATE 183

EDIFICI ANTISISMICI ABITATI 169

**N.B.:** Il numero totale di piastre è 185. Il numero 183 è un numero di piastre equivalenti (in termini di area abitabile) in quanto alcune hanno dimensioni ridotte rispetto a quelle standard (superficie 57m x 21m).
