



E M E R G E N Z A T E R R E M O T O A B R U Z Z O



**L'Aquila, Auditorium Scuola Guardia di Finanza
29 Gennaio 2010**

6 Aprile 2009, ore 3.32: il terremoto dell'Aquila



Le prime ore

6 aprile 2009, h. 4:15

Si riunisce il Comitato operativo



6 aprile 2009, h. 9:00

Viene organizzata la DI.COMA.C all'interno della Scuola della Guardia di Finanza di Coppito



La gestione della prima emergenza



Il terremoto in Abruzzo: i numeri dell'emergenza

	prime 48 h	valore massimo raggiunto	Il dato al 29 gennaio
Popolazione assistita	27.772 Tendopoli → 17.772 Hotel → 10.000	67.459 Tendopoli → 35.690 Hotel → 31.769	10.028 Tendopoli → 0 Alberghi/caserma → 7.652 Case private → 2.376
Aree di ricovero	30	171	0
Tende	2.962	5.957	0
Cucine da campo	10	107	0
PMA – presidi sanitari	13	47	0

Spese sostenute per l'assistenza alla popolazione: 456,3 milioni di euro



La reazione del sistema di protezione civile: le forze in campo



Il lavoro sul rischio sismico

Le verifiche di agibilità



72.855: verifiche effettuate
1.500: tecnici
1.000: media verifiche giornaliere

La microzonazione sismica



La Commissione di esperti internazionali



La Microzonazione Sismica è un utile strumento per la pianificazione urbanistica e per la ricostruzione. Lo studio ha interessato tutti i Comuni in cui si è registrata un'intensità maggiore o uguale al VII grado della scala Mercalli.

Il G8 a L'Aquila



I precedenti terremoti in Italia



Magnitudo: 6.1
296 vittime

Comuni colpiti:
15

Centro più esteso*:
Salemi → 11.145
abitanti



Magnitudo: 6.4
965 vittime

Comuni colpiti:
119

Centro più esteso*:
Gemona → 11.190
abitanti



Magnitudo: 6.9
2735 vittime

Comuni colpiti:
506

Centro più esteso*:
Lioni → 6.410
abitanti




Magnitudo: 6.1
11 vittime

Comuni colpiti:
46

Centro più esteso*:
Nocera Umbra → 6.084
abitanti

* Per l'individuazione del centro abitato più esteso sono stati presi in considerazione quelli classificati con grado pari o superiore al IX della scala Mercalli. Il danneggiamento sismico è stato considerato sulla base non di limiti amministrativi comunali ma per omogeneità urbanistiche.

... a confronto con il terremoto dell'Aquila

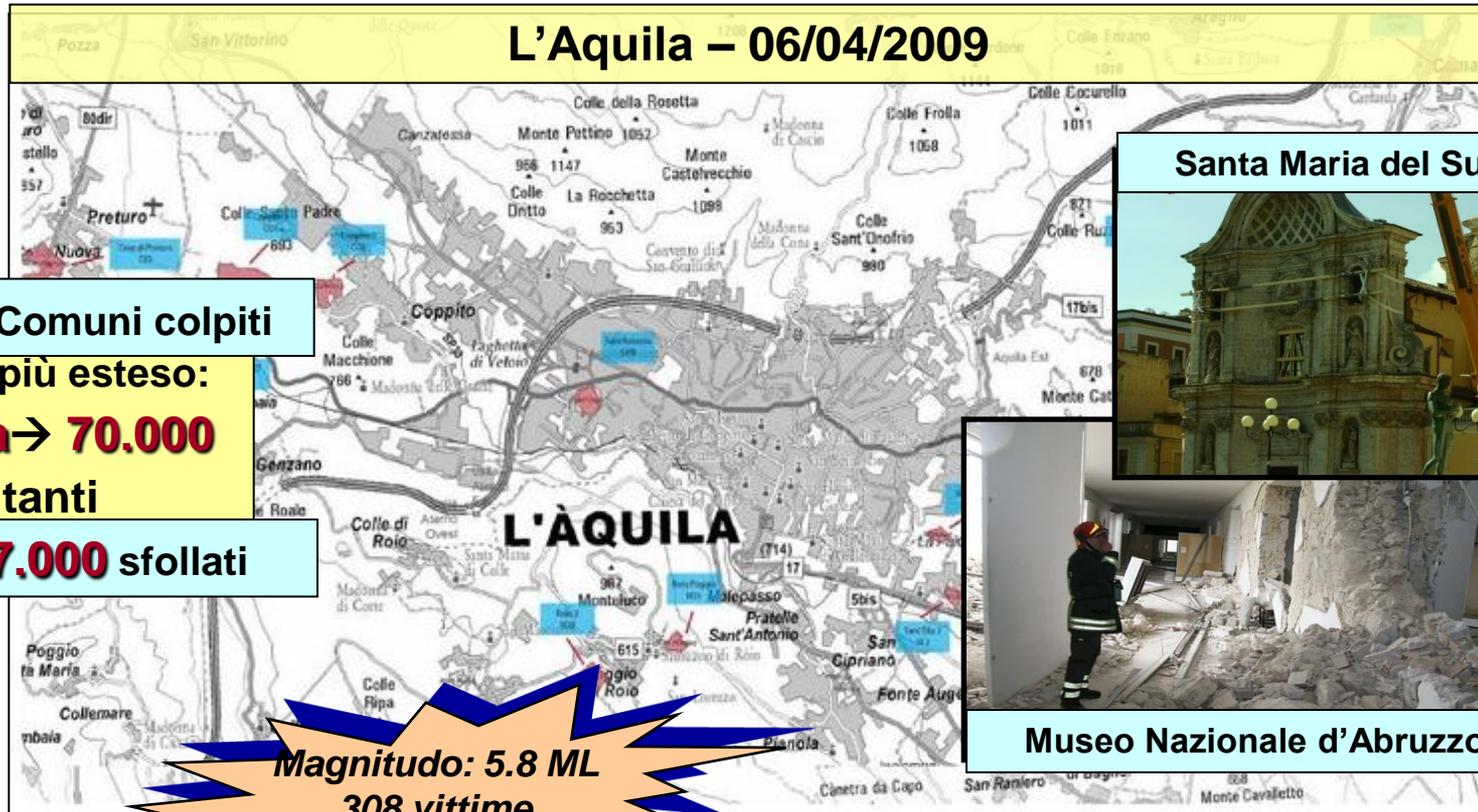

Per la prima volta dal 1908, quando più di 86.000 persone morirono durante il terremoto di Messina e Reggio Calabria, un forte evento sismico ha avuto come epicentro una grande città italiana, ricca di beni culturali e con un centro storico densamente popolato, soprattutto da giovani.

La “ricostruzione leggera”: CASE e MAP

A)



complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili

C.a.s.e.




L'Aquila → Progetto CASE

Realizzazione di Complessi Antisismici Sostenibili ed Ecocompatibili in 19 aree, evitando la creazione di un'unica grande nuova città e rispettando invece l'identità del capoluogo abruzzese.

Costo totale: € 777,7 milioni

B)

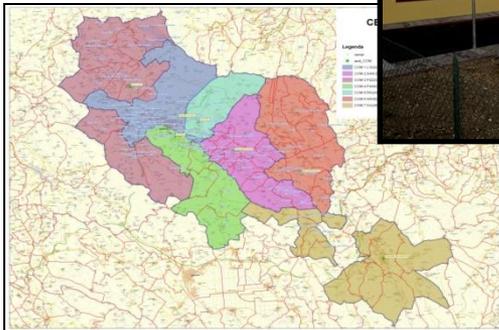

Altri Comuni del cratere o frazioni di L'Aquila → Progetto MAP – Villette di legno

Realizzazione di villette di legno in 141 aree, 21 nelle frazioni del Comune dell'Aquila e 119 in aree situate negli altri comuni del cratere

Costo totale: € 286,6 milioni

Il Progetto CASE: tempi e numeri

Settembre 2009



23 aprile: annuncio Progetto C.A.S.E.

29 settembre: inaugurati i primi 400 appartamenti a Cese di Preturo e Bazzano

23 dicembre: tutte le aree del Progetto sono abitate, con le prime consegne a Coppito 2

TOTALI

EDIFICI		APPARTAMENTI		ABITANTI			
TOTALI	29/01/2010	TOTALI	29/01/2010		TOTALI		29/01/2010
			REALI	OCCUPATI	STANDARD	DENSI	
183	171	4449	3898	3466	15205	18765	12754

A partire dal 29 settembre sono stati consegnati in media **300 appartamenti a settimana**. A fine febbraio è prevista la fine delle consegne

MAP – Villette di legno. Tempi e numeri

I numeri

	MAP PREVISTI (DPC + DONATI)	MAP DPC CONSEGNATI	MAP DONATI (TUTTI CONSEGNATI)	PERSONE PREVISTE	N. ABITANTI
Fuori L'Aquila →	2.174	714	176	5.729	2.483
L'Aquila →	1.225	285	112	2.800	670

Le villette di legno fuori L'Aquila: i tempi

18 giugno: pubblicato il primo bando per la fornitura di 1.500 MAP

21 agosto: inaugurato il primo villaggio di MAP donati a Stiffe (S. Demetrio Né Vestini)

31 ottobre: con Barete inizia la consegna dei MAP DPC



Le villette di legno a L'Aquila: i tempi

15 settembre: inaugurazione dei Map donati ad Onna

17 settembre: pubblicata l'ordinanza n. 3806 per l'assegnazione di Map ai cittadini dell'Aquila

30 dicembre: con Arischia iniziano le consegne

MUSP – Scuole prefabbricate : costi, tempi e numeri

I numeri:

MUSP PREVISTI	MUSP CONSEGNATI	STUDENTI NEL CRATERE	STUDENTI NEI MUSP	SCUOLE IN MURATURA "A" O "B"	SCUOLE IN MURATURA RIAPERTE
32	29	17.000	6.200	55	55

I tempi:
35 gg

31 luglio: firmato il decreto n. 15 che individua le prime aree per la costruzione di musp

12 agosto: iniziano i lavori per realizzare i moduli ad uso scolastico

21 settembre: aprono i primi musp per l'inizio dell'anno scolastico

I costi: 77,8 milioni di euro



Il 22 dicembre 2009 è stata inaugurata la nuova struttura del Conservatorio, in grado di ospitare 800 studenti e 100 insegnanti

Il CAS e gli affitti agevolati

Tra le soluzioni abitative temporanee che non hanno comportato opere di costruzione sono state previsti l'indennità di autonoma sistemazione e gli affitti agevolati. I provvedimenti sono rivolti alle persone che vogliono scegliere autonomamente dove andare ad abitare.

Il CAS: tempi e costi

NUCLEI FAMILIARI	POPOLAZIONE ALLOGGIATA
13.840*	28.117*

9 aprile: stabilito con ordinanza n. 3754. Viene successivamente esteso ai cittadini dei comuni al di fuori del cratere.

30 luglio: il contributo aumenta con l'ordinanza n. 3797, fino a 600 euro al mese. Chi vive da solo può ricevere 300 euro.

22 dicembre: L'[ordinanza n. 3832](#) proroga fino al 31 dicembre 2010 il termine per usufruire dell'indennità di autonoma sistemazione.



Gli affitti agevolati

LOCALITÀ	NUCLEI FAMILIARI	POPOLAZIONE ALLOGGIATA
L'Aquila	546*	1567*
Giulianova	152*	397*
Monte Silvano	64*	160*
Rocca di Mezzo	33*	63*

*I numeri * dati relativi al solo ai cittadini dell'Aquila*

Il canone è pagato dal Comune al proprietario dell'immobile attraverso una convenzione, mentre **solo gli oneri condominiali sono a carico dell'affittuario**. Il contratto è di 6 mesi, rinnovabile fino a 18 mesi e il canone, salvo diversa dichiarazione di congruità, va dai 400 fino agli 800 euro a seconda della grandezza dell'appartamento.

La tutela dei beni culturali

I numeri

Ad oggi, effettuati **1.763** sopralluoghi su beni culturali, dei quali solo il **24%** è risultato agibile.

Gli edifici già messi in sicurezza dai Vigili del Fuoco sono **180**, mentre sono 25 gli interventi ancora da ultimare.

Sono **45** i beni monumentali aquilani da restaurare inseriti nel Progetto “Salviamo l’arte in Abruzzo”, per i quali sono stati raccolti **€ 2.435.882,19**.



S. Maria di Paganica

La chiesa realizzata a Pianola



Progetto “Una chiesa per Natale”

Costi: 7 milioni di euro


N. Chiese coinvolte: 73

Progetto MEP – Moduli ecclesiastici provvisori

Costi: 600.000 euro

N. MEP: 3 (Pianola, Sant’Eusanio Forconese, San Demetrio)

La Basilica di Collemaggio

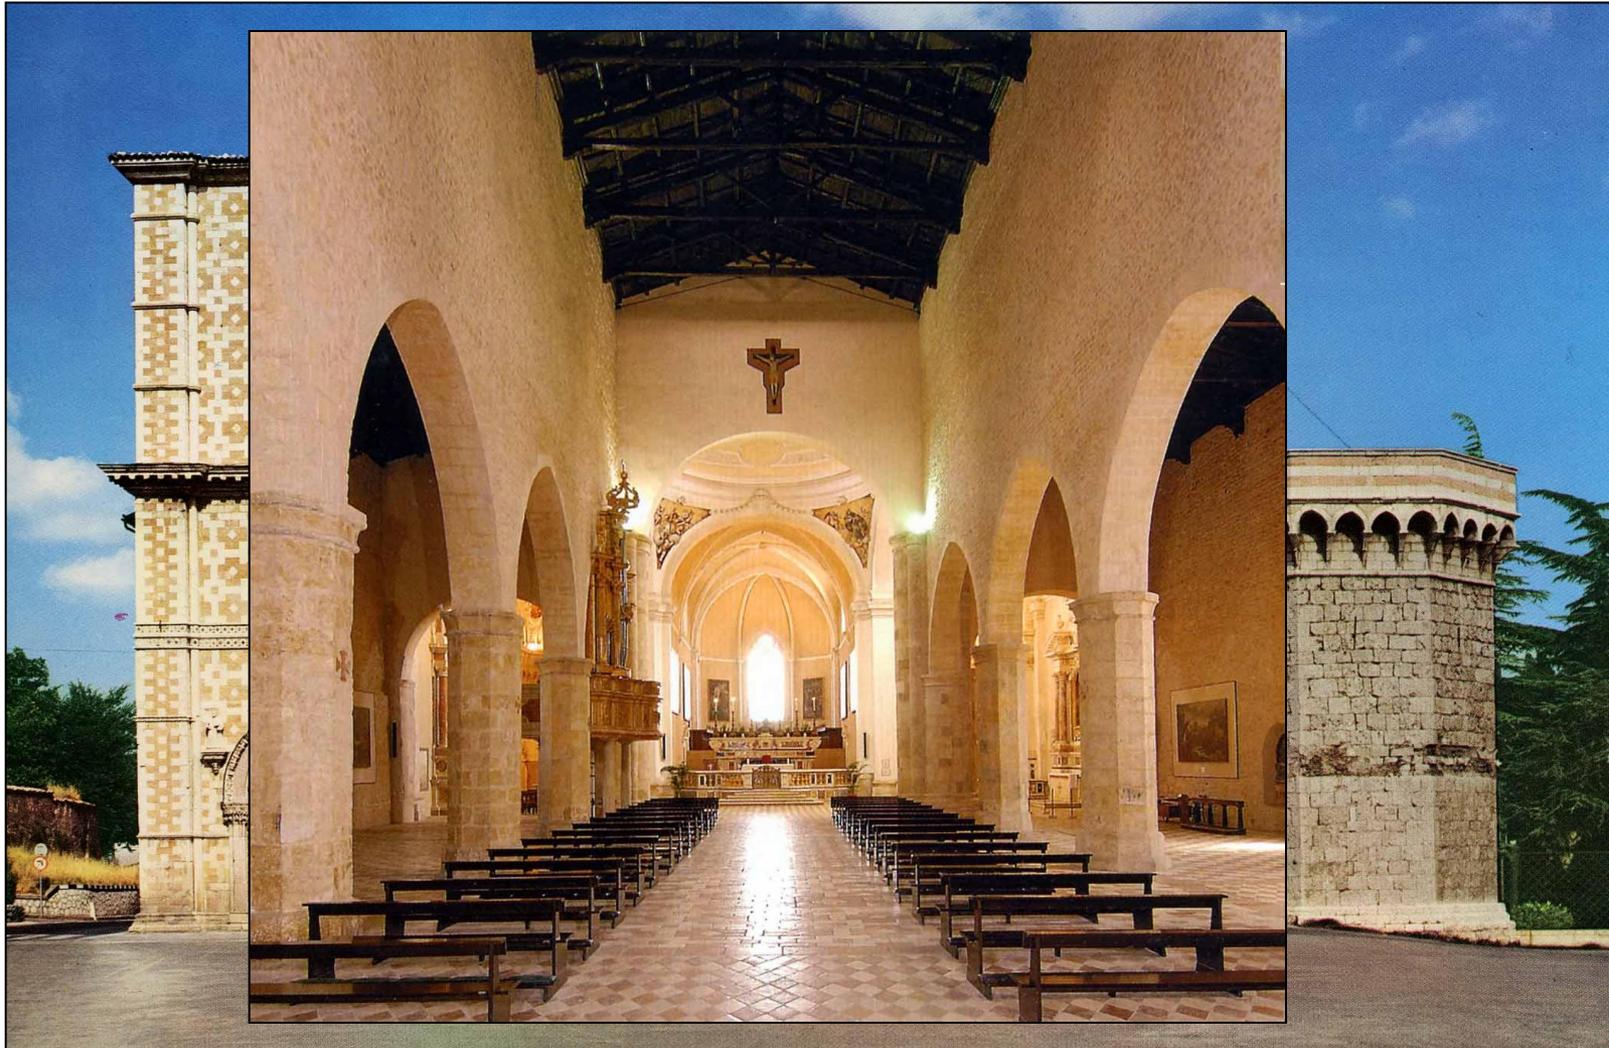

La Basilica dopo il terremoto



La riapertura della Basilica per Natale



Il Dipartimento della Protezione Civile in Abruzzo: i numeri

DATI RELATIVI AGLI AFFIDAMENTI DISPOSTI	
Procedure di gara espletate	286
Contratti d'appalto sottoscritti (C.A.S.E – M.A.P. – M.U.S.P. – M.E.P.)	366
Imprese appaltatrici	214
Imprese subappaltatrici e fornitrici	1.536
Importi degli affidamenti disposti	€ 1 miliardo 143 milioni circa
Importo dei subappalti, dei noli e delle forniture autorizzati	€ 288 milioni circa
Affidamenti disposti per la prima emergenza	952
Contenziosi giudiziari in corso	10
Contenziosi definiti con condanna dell'Amministrazione	0
Imprese decadute dall'aggiudicazione degli appalti per interdittiva antimafia	1
Rilievi formulati dalla Corte dei Conti	0
Imprese estromesse da R.T.I. aggiudicatari per interdittiva antimafia	1
Revoche dei subappalti	2

Il Sistema di Protezione Civile in Abruzzo: i numeri

Vigili del Fuoco	202.000 interventi (1/4 del totale nazionale) 4.350.000 ore lavorate
Forze Armate	230.000 giornate/uomo
Croce Rossa Internazionale	Oltre 1.300.000 pasti distribuiti
Volontari	730.000 giornate
DPC	450.000 giornate/uomo 2.700.000 ore lavorate






Only an Accountant Could Catch Al Capone.



Infamous mobster Al Capone wasn't easy to catch. But when Special Agents of the IRS stepped in and charged him with tax evasion, this crime czar's career came to an end. Proof that sometimes only the accountant can apprehend the criminal.

If you'd like to put your accounting skills to work in a challenging and action oriented job, IRS Special Agent may be the ideal career for you. If you'd like more information just contact your local IRS office.



Be an Accountant With Conviction.





Crollo di San Giuliano condanne confermate

